




アルミ100見込みフロント内蔵
片引き自動ドア装置一式交換工事

※アルミ100見込みフロントに木材を貼り付けています。

見積範囲

- ①老朽化自動ドア装置撤去処分
- ②新規片引き自動ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ、補助センサ
- ④上記製品、材料取付調整

※図面寸法は、現場調査報告に基づいています。
施工の際は必ずご確認ください。

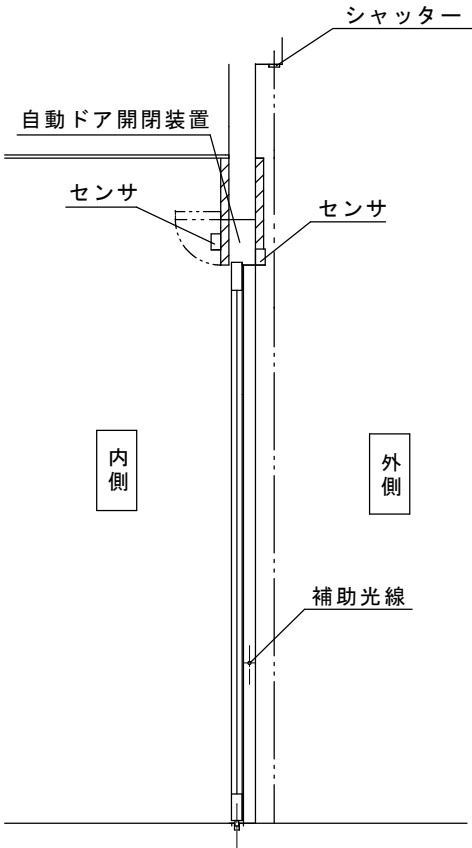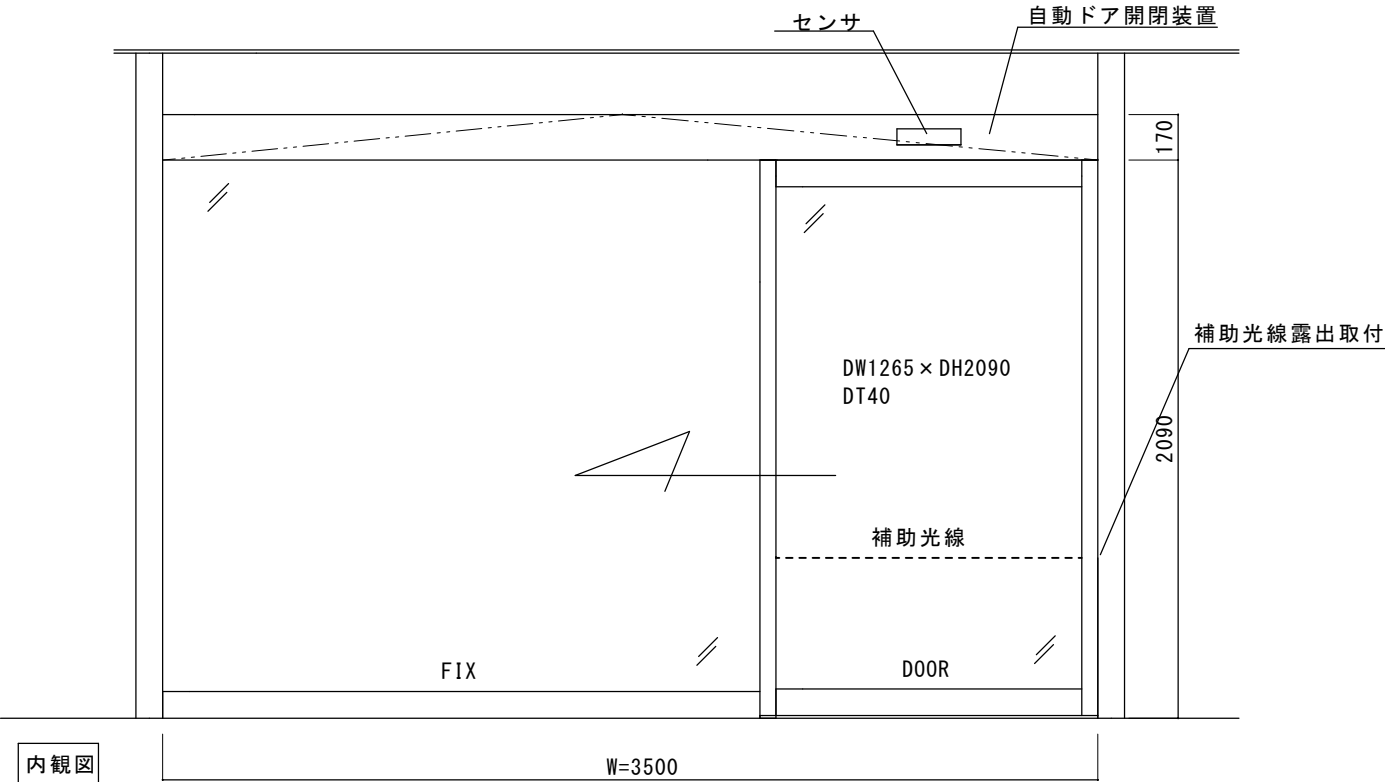

図面名称 平面図・姿図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 道の駅みろく 自動ドア装置一式交換工事	
							野口	野口		1/20	施工		殿
					NPO法人全国自動ドア産業振興会					殿	月 日		1

建物外観



自動ドア外側の様子



自動ドア内側の様子



自動ドア装置（内観左側の様子）



自動ドア装置（内観右側の様子）



外側センサの様子、補助光線配線の様子



内側センサの様子



補助光線配線の様子 (センサヘッド部)



補助光線配線の様子(自動ドア開閉装置との取り合い)



ガイドレールの様子 隙間はありますが、狭窄箇所はありません。がたつきもないそうです。





平成9年のオープン以来、年間65,000人に利用され、道路利用者の利便性だけでなく、地域の住民と協働しながら持続的なまちづくりにも欠かせない施設ですが、老朽化が心配されていました。

香川県さぬき市大川町富田中3286番地
道の駅みろく様



2022年9月21日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①施工前外観



⑤新規自動ドア開閉装置



⑥新規自動ドア開閉装置取




②施工前内観



⑦内外起動センサ交換



⑧補助光線センサ交換



③老朽化自動ドア開閉装置



⑧施工完了



④自動ドア装置撤去



after
