

見積範圍

- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③内外起動センサ（無目付けセンサ）
- ④補助光線センサ
- ⑤上記材料交換取付調整

※本図は、現場調査報告に基づき作成されています。
施工の際には、確認が必要です。


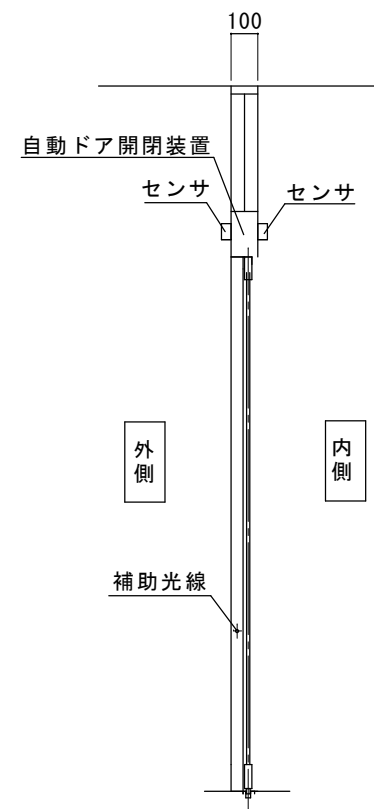


図 面 名 称	△		JADSA	理 事	理 事	設 計	製 図	照 査	縮 尺	設計監理		工事名	狛江市南部地域センター		
平面図・姿図・縦断面図	△					野口	野口			1/20		殿	月 日	自動ドア装置一式交換工事	
	△										施 工			設計番号	図 番
	No. 月 日	訂 正 事 項		NPO法人全国自動ドア産業振興会								殿	月 日		1

狛江市南部地域センター
建物外観



自動ドアフロント外観 アルミブロンズ 100 見込み自動ドアフロント 内外無目付けセンサ

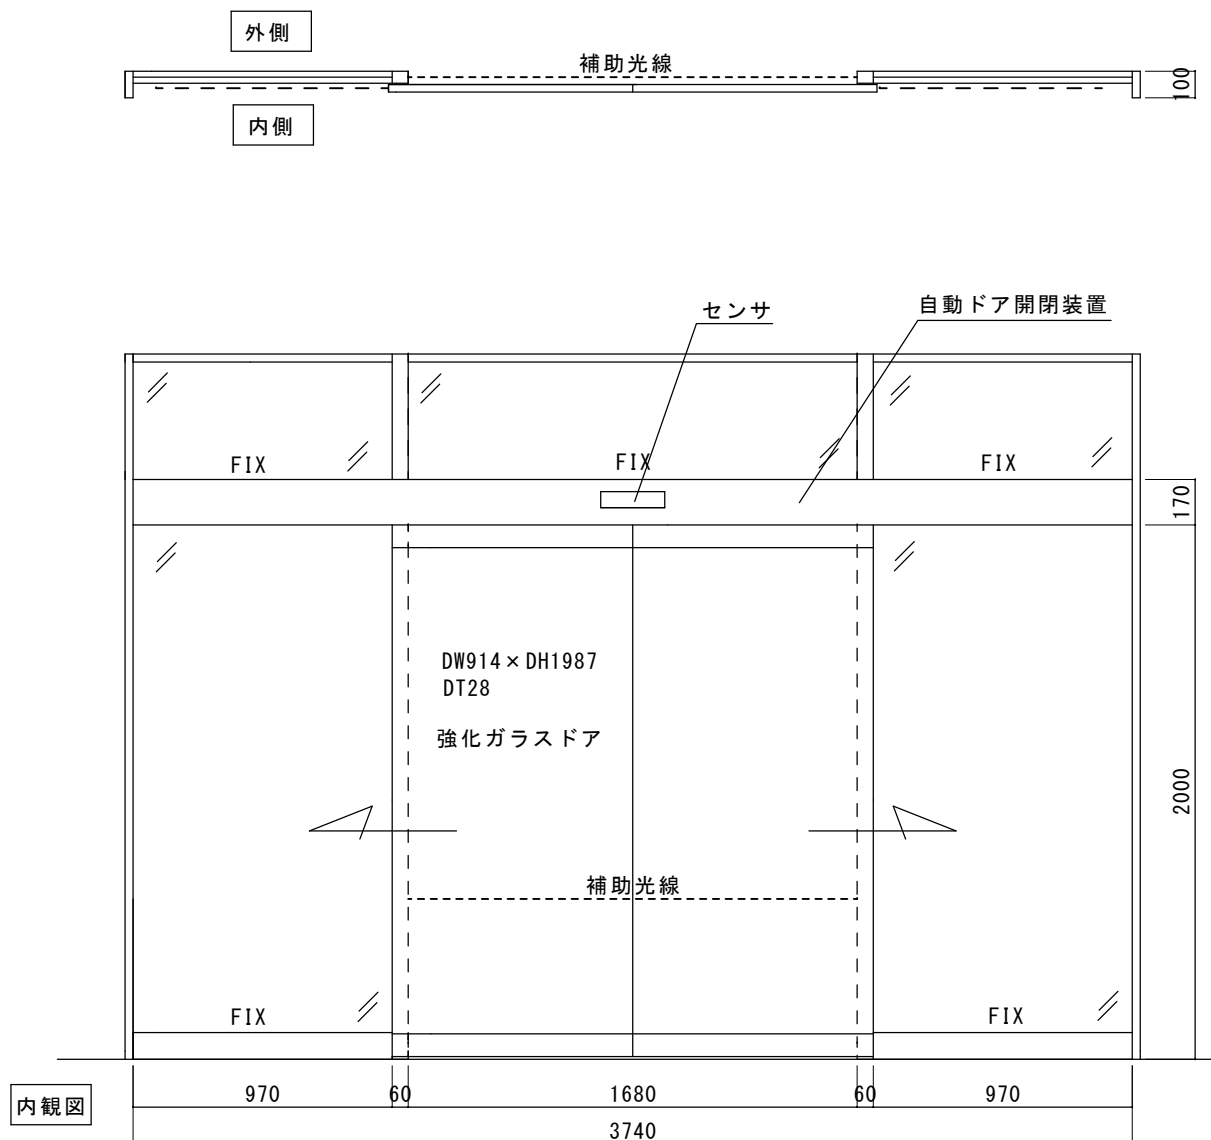


補助光線センサ 対向1光線式



特記事項①

埋め込みガイドレールの中心部が狭窄しています。ガイドレールのアンカーは未だしっかりと効いていて、ぐらつきはありません。要経過観察。ガイドレールのぐらつきが出たら交換となります。(別途工事)

※ガイドレール狭窄箇所（開口部中心の鍵受け部分が狭窄していました）

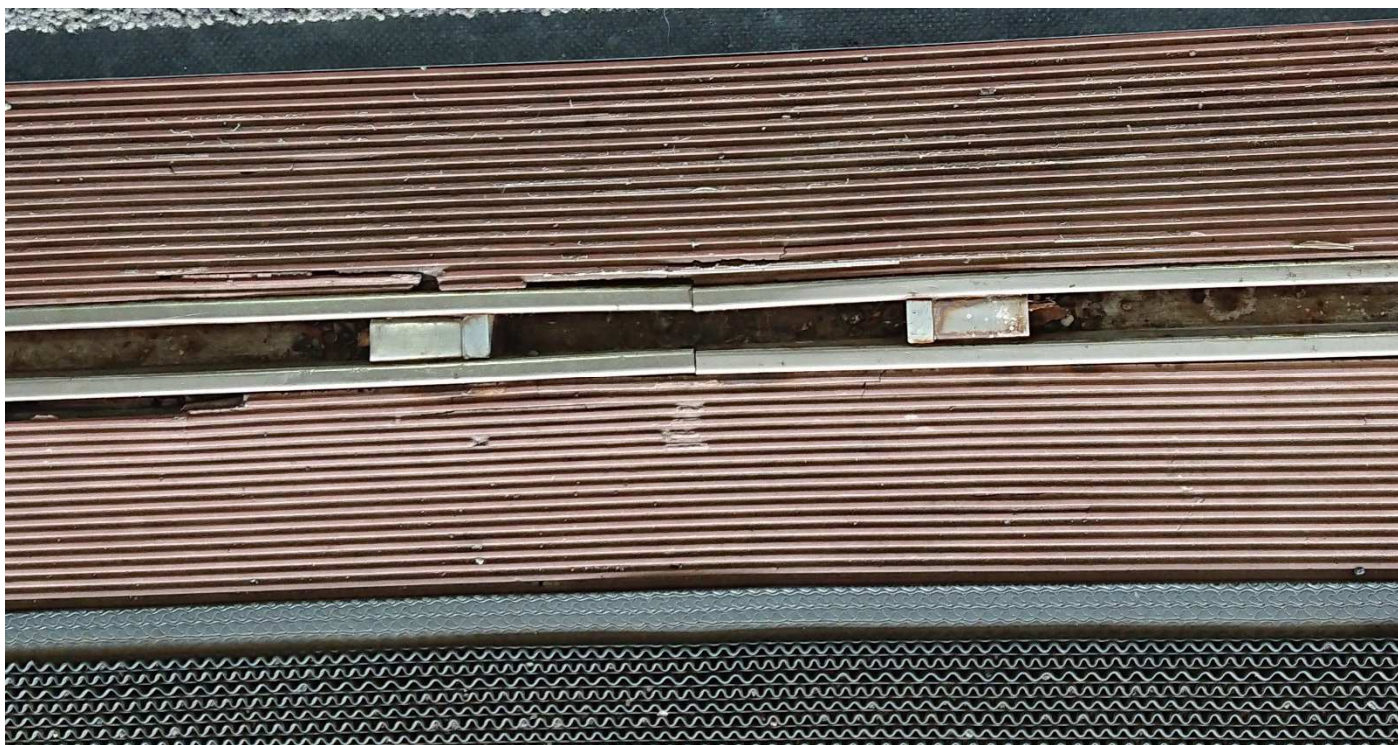

ドアの吊り上げ代の様子



特記事項②

ドアベルを鳴らすように、針金が取付られています。(内観左側ドア)





東京都狛江市猪方4-11-1
南部地域センター 様

＜申請理由＞

地域住民の交流の場として、乳幼児から高齢者まで多世代の方、障がい者も含む多くの住民が訪れる施設です。自動ドアの保守業者より老朽化の進行による交換を勧められていました。

出入り口の自動ドアが停止してしまうと、多くの利用者に不便を強いてしまう恐れがあることを懸念していました。

2023年3月14日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽化による危険を無くしました。

①施工前(外観)



②施工前(内観)



③老朽化自動ドア開閉装置



④自動ドア開閉装置撤去



⑤撤去した自動ドア開閉装置



⑦ 施工完了(内観)



⑧ 施工完了(外観)



⑥新規自動ドア開閉装置

