
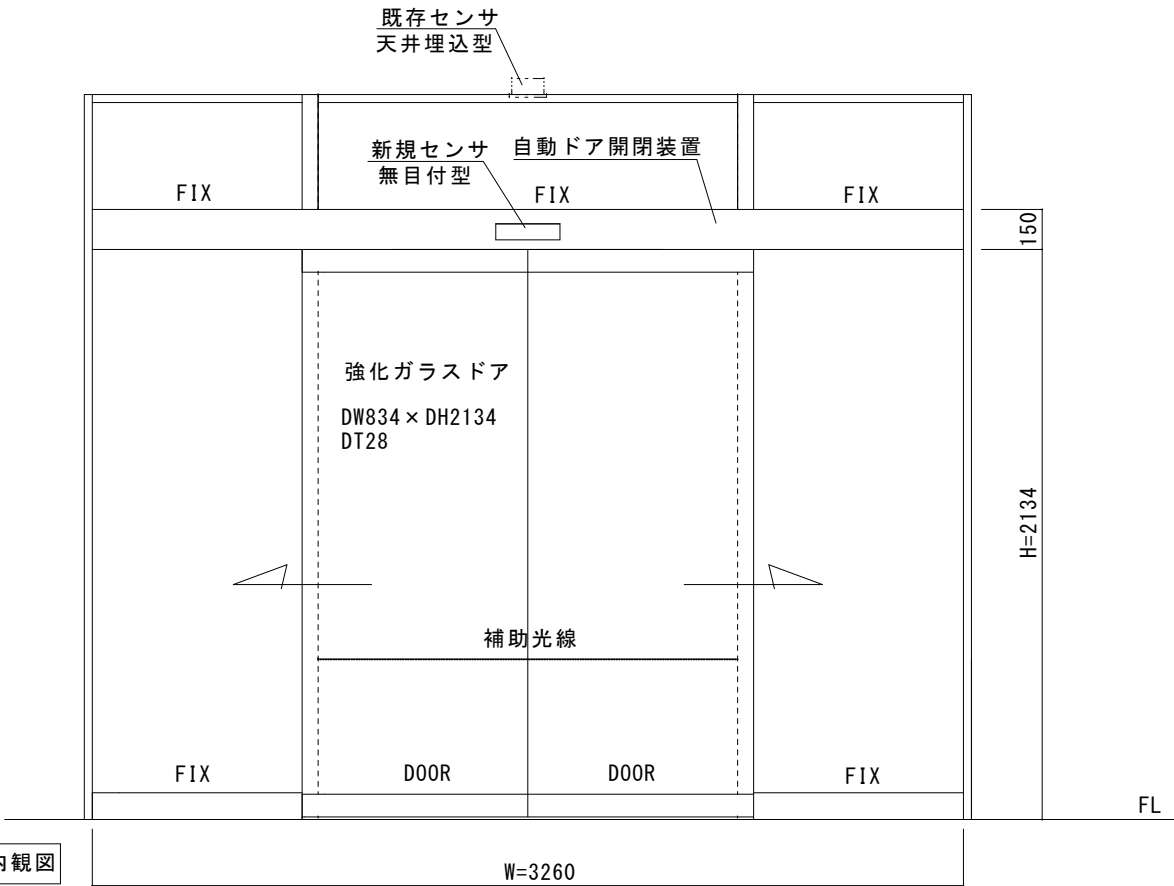


アルミシルバー70見込みフロント外付両引き自動ドア装置一式交換工事

見積範囲

- ①老朽劣化自動ドア装置一式撤去
- ②新規両引き自動ドア開閉装置
- ③新規内外起動センサ
- ④新規補助光センサ
- ⑤上記材料交換取付調整工事一式

※本図は現場調査報告に基づき作図しています
施工の際は確認が必要です
※内側起動センサは無目付けセンサに変更します



内観図


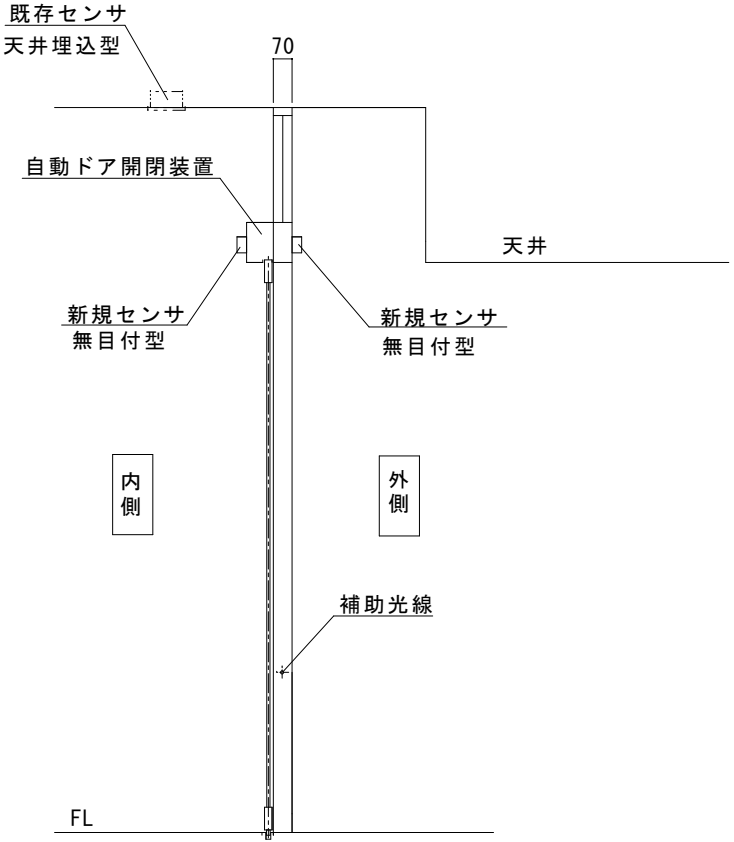


図 面 名 称		訂 正 事 項		JADSA	理 事 理 事 設 計 製 図 照 査 縮 尺		設計監理		工事名			
平面図・姿図・縦断面図							野口野口	1/20	殿	月 日	さぬき市大川公民館	
											自動ドア装置一式交換工事	
									施 工		設計番号	図 番
	No. 月日					NPO法人全国自動ドア産業振興会			殿	月 日		1







現場名	大川公民館		直付け調査資料
住 所	香川県さぬき市大川町富田中2215-1		
設置場所	正面入り		
担当者	下山		
既存エンジン	ナブコ	交換エンジン	JA-150D-ATJ
外側既存センサ	無目センサ、天井センサ	外側センサ	0AB-21SCAN □併用
内側既存センサ	天井センサ	内側センサ	0AB-21SCAN □併用
既存補助光線	対向式	補助光線	☒ 1光線 □2光線
ドア開閉方式	☒ スライド □円形 □2重スライド □フルオープン □3重スライド	点検口寸法	縦 mm 横 mm
引き勝手(内観)	□右引き □左引き ☒ 両引き	ランマ	☒ 有り □無し
サッシW/H寸法	W mm H mm	難易度	□0.5~2.0h □2.0~3.0h ☒ 3.0~4.0h (現場作業時間) □4.0~5.0h □5.0~6.0h □6.0~7.0h
サッシ材質	☒ アルミ □ステン □スチール □木	特殊仕様	☒ 二つ割 □合板穴化工有り □カバーなし □重量用 □停電時解錠型 □停電時施錠型 □バッテリー開放 □バッテリー閉鎖
仕上げ色	☒ ホワイト □H.L □鏡面 ☒ シルバー □ブロンズ □ブラック □ステンカラー □つや消し	必要人員	☒ 1人 □2人 □3人 □4人以上
ドア種類	□アルミ框 ☒ 強化ガラス □ステン框 □スリム框 □両面フラッシュ □片面フラッシュ □中棧付き	電 源	□コンセント □壁スイッチ ☒ 直結
ドア寸法	DW 834 DH 2134 DT 28	現場状況	□有人現場 ☒ 無人現場
ドア吊元ピッチ	120 mm	障害物	□有り ☒ 無し
引き残し	75 mm	現場写真	□全体 □正面 □内観 □外センサ □内センサ □補助センサ □電源 □エンジン内部(納まり)
ドア芯	20 mm	火気	□電動グラインダー □溶接機
取付け法	☒ ビス □ボルト □溶接 □ガラスポケット □コーナーピース	モール配線工事	□有り m ☒ 無し
※既存サッシに反り・曲がり・損傷は有りませんか？		□有り ☒ 無し	備考(駐車場情報・連絡事項など)
※ガイドレールに狭窄部や浮き上がりは有りませんか？		□有り ☒ 無し	
※既存ドアに反り・曲がり・損傷は有りませんか？		□有り ☒ 無し	
図 面 名 称	 JADSA		部 長 課 長 設 計 製 図 照 査 総 尺 1/20 施 工 設 計 監 理 設 計 番 号
No. 月 日 訂 正 事 項	NPO法人全国自動ドア産業振興会 設 計 番 号		

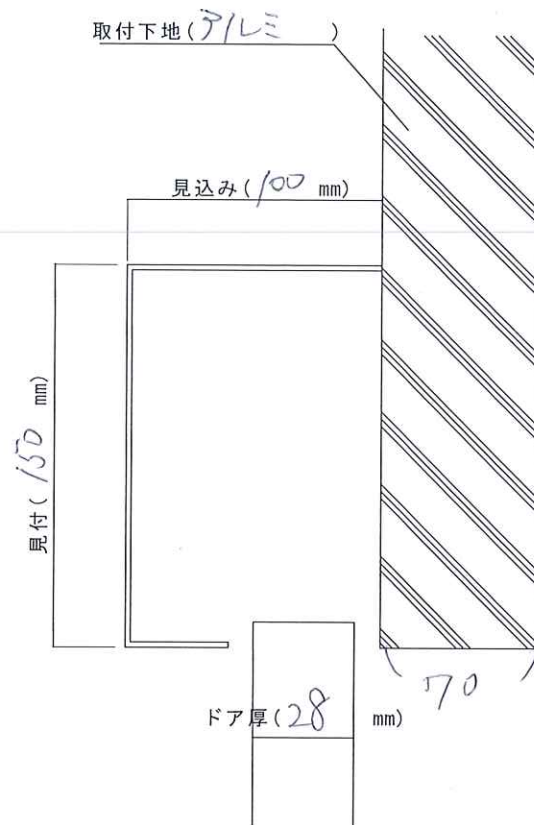

内観図

フロント材質: ☐ SUS ☐ ST ☒ AL ☐ W ☐ その他 ()
 エンジン納まり: ☐ 内蔵 ☒ 直付
 起動センサ: 外 (天井) () 内 (天井) () その他 ()
 補助センサ: 外 () 内 () 対向・反射 (/) 光線
 特殊仕様 ()

※JIS 安全距離 () JIS 保護方策 (要・不要)

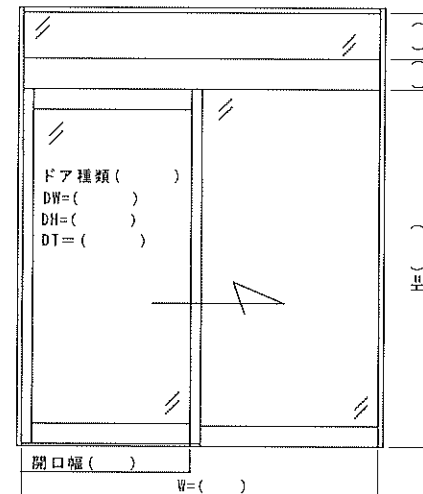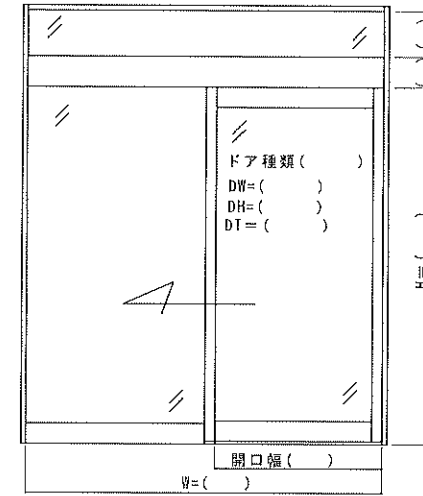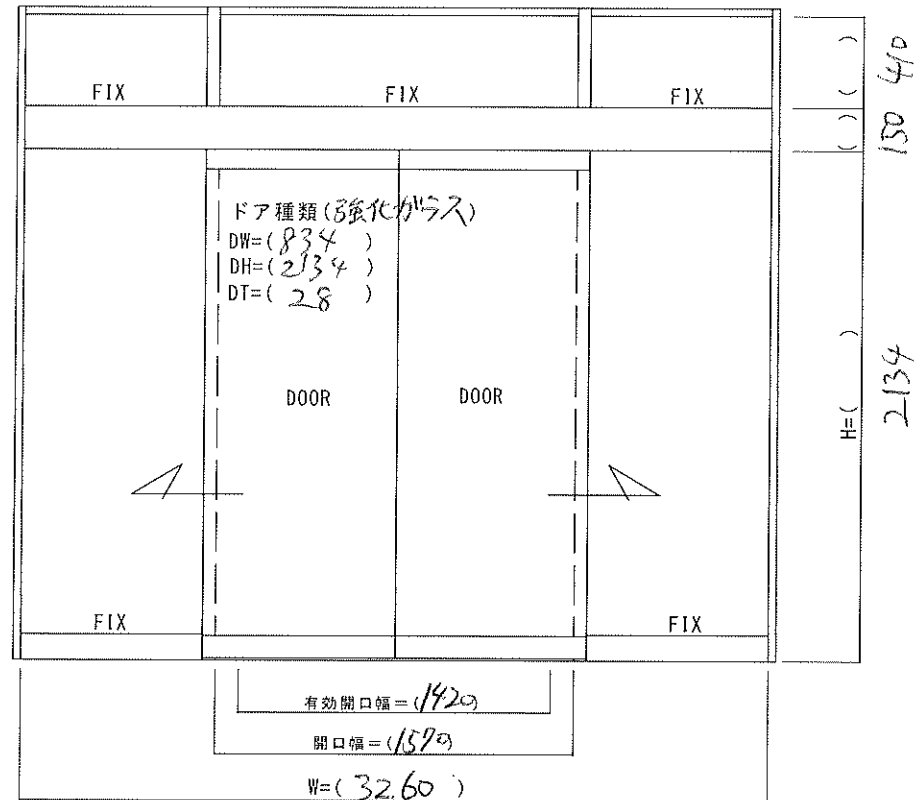

図面名称

現場調査表

△			
△			
△			
No.	月日	訂正事項	

JADSA

部長	課長	設計	製図	照査	総尺	設計監理
		野口			1/20	施工
NPO法人全国自動ドア産業振興会						

工事名	股	月	日
設計番号	股	月	日

図番
1

件名：大川公民館

建物外観



コメント

自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観



件名：

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



エンジン製造年数
2022年のようです

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



外側起動センサ



件名：

内側起動センサ



現在天井センサが付
いていますがエンジ
ン交換の際には内外
無目センサでよいと
のことでした。

補助光線センサ



補助センサ/併用センサ

--	--

件名：
点検口

	コメント
--	------

附属機器

--	--

その他（予備）

	
---	--
