
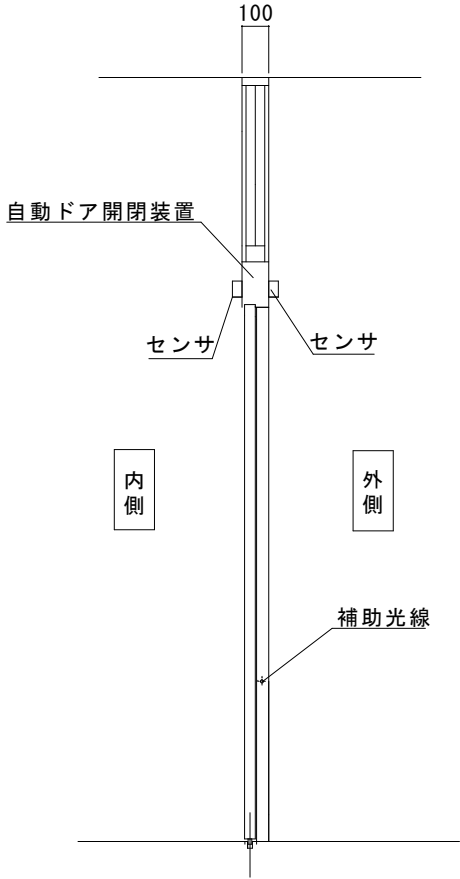


アルミシルバー100見込みフロント内蔵
両引き自動ドア装置一式交換工事

- 見積範囲
- ①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
 - ②新規両引き自動ドア開閉装置
 - ③新規内外起動センサ
 - ④新規補助光線センサ
 - ⑤上記材料交換取付調整工事一式

※本図は現場調査報告に基づき作図しています
施工の際には確認が必要です

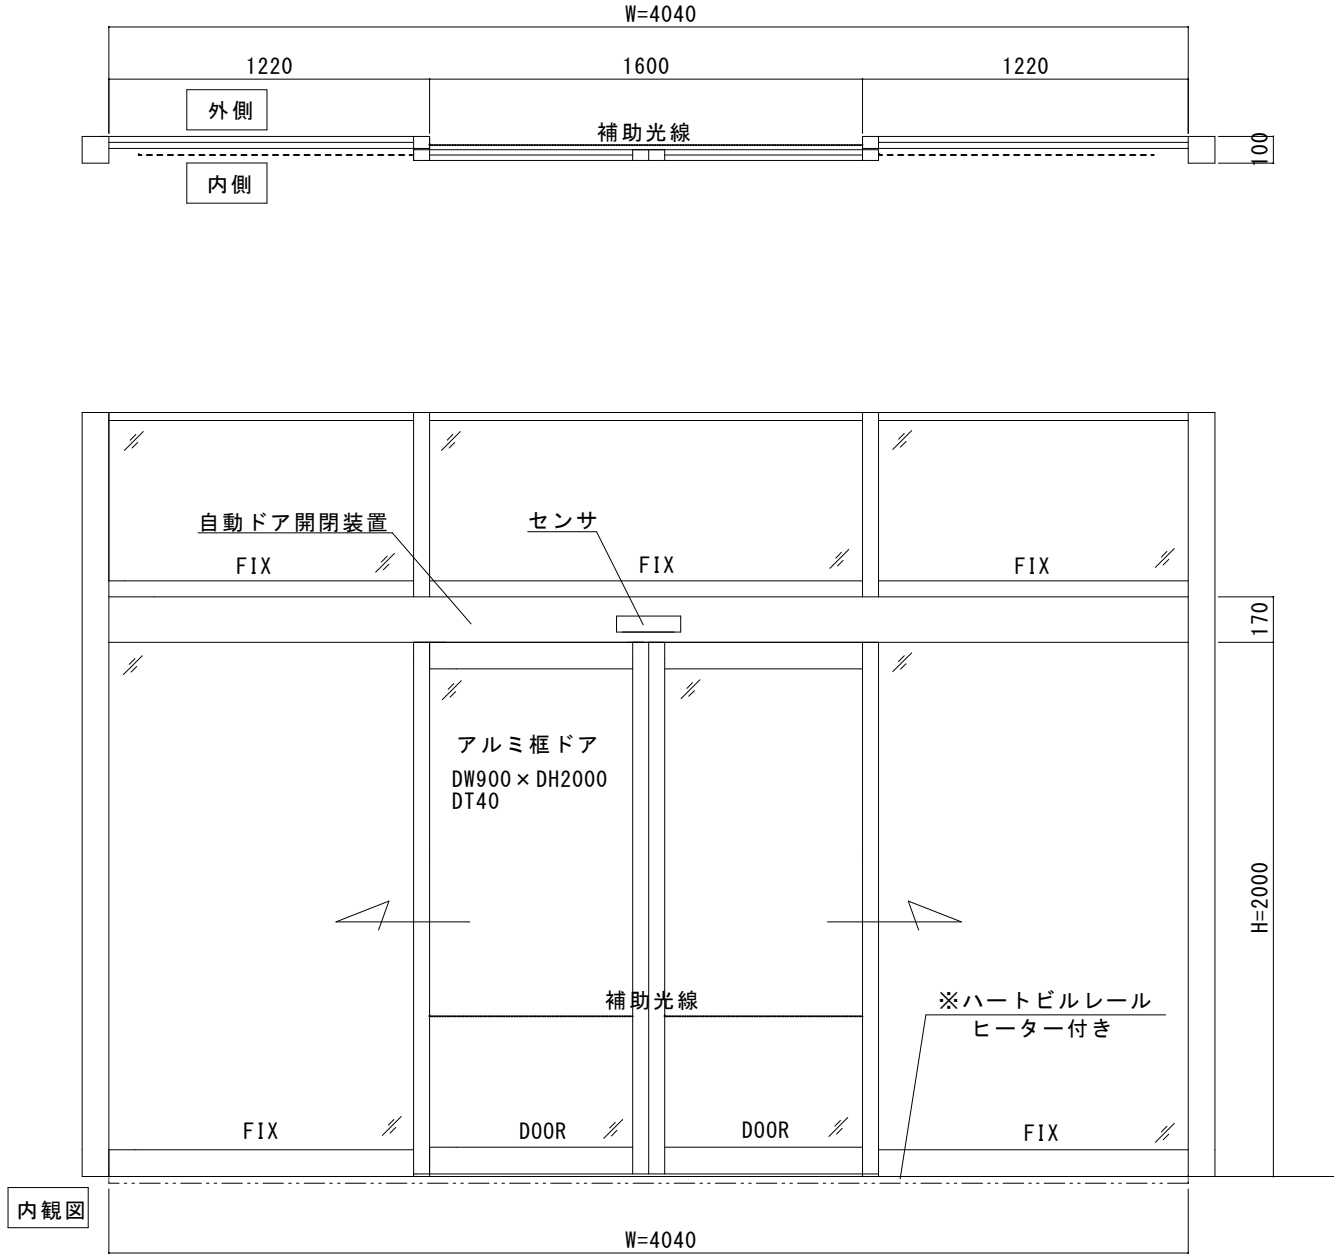

図面名称				JADSA				設計監理				工事名 紫波斎苑かたくりの丘			
平面図・姿図・縦断面図				野口 野口				野口 野口				両引き自動ドア装置一式交換工事			
No. 月日				訂正事項				NPO法人全国自動ドア産業振興会				設計番号			
												図番			

現場名	紫波森苑 かたくりの丘		アルミ内蔵納まり調査資料	
住 所	岩手県紫波郡紫波町屋山字杉田34-6			
設置場所	会葬者入口 風除室外部			
担当者	紫波町役場 環境課 藤戸様			
既存エンジン	ナブコ アルミ内蔵 両引き	交換エンジン	COS-126D-ATJ 端子台付	
外側既存センサ	無目センサ NS-A01/NS-A03	外側センサ	OAB-215V(S) ☐ 併用	
内側既存センサ	無目センサ SSP-N1	内側センサ	OAB-215V(S) ☐ 併用	
既存補助光線	対向1光束 NPA-001	補助光線	☒ 1光線 ☐ 2光線	
ドア開閉方式	☒ スライド ☐ 円形 ☐ 2重スライド ☐ フルオープン ☐ 3重スライド	点検口寸法	縦 mm 横 mm	
		ランマ	☒ 有り ☐ 無し	
引き勝手(内観)	☐ 右引き ☐ 左引き ☒ 両引き	難易度	☐ 0.5~2.0h ☐ 2.0~3.0h ☒ 3.0~4.0h	
サッシW/H寸法	W mm H mm	(現場作業時間)	☐ 4.0~5.0h ☐ 5.0~6.0h ☐ 6.0~7.0h	
サッシ材質	☒ アルミ ☐ ステン ☐ スチール ☐ 木	特殊仕様	☒ 二つ割 ☐ 台板穴化工有り ☐ カバーなし ☐ 重量用 ☐ 停電時解錠型 ☐ 停電時施錠型 ☐ バッテリー開放 ☐ バッテリー閉鎖	
仕上り色	☐ ホワイต์ ☐ H.L ☐ 鏡面 ☒ シルバー ☐ ブロンズ ☐ ブラック ☐ ステンカラー ☐ つや消し			
ドア種類	☒ アルミ框 ☐ 強化ガラス ☐ ステン框 ☐ スリム框 ☐ 両面フラッシュ ☐ 片面フラッシュ ☐ 中棧付き	必要人員	☐ 1人 ☒ 2人 ☐ 3人 ☐ 4人以上	
		電 源	☐ コンセント ☐ 壁スイッチ ☒ 直結	
ドア寸法	DW 900 DH 2000 DT 40	現場状況	☒ 有人現場 ☐ 無人現場	
ドア吊元ピッチ	120 mm	障害物	☐ 有り ☒ 無し	
引き残し	自動時 130 mm 手動時 なし	現場写真	☒ 全体 ☒ 正面 ☒ 内観 ☒ 外センサ ☒ 内センサ ☒ 補助センサ ☐ 電源 ☒ エンジン内部(納まり)	
ドア芯	65 mm			
取付け法	☒ ビス ☒ ボルト ☐ 溶接 ☐ ガラスポケット ☐ コーナーピース	火気	☐ 電動グラインダー ☐ 溶接機	
		モール配線工事	☐ 有り m ☒ 無し	
※既存サッシに反り・曲がり・損傷は有りますか？		☐ 有り ☒ 無し	備考(駐車場情報・連絡事項など)	
※ガイドレールに狭窄部や浮き上がりはありますか？		☐ 有り ☒ 無し	※現在ナブコが保守契約中とのこと	
※既存ドアに反り・曲がり・損傷は有りますか？		☐ 有り ☒ 無し		
図 面 名 称	訂 正 事 項		JADSA	
No. 月 日		設計監理		工事名
		施 工		設計番号
		NPO法人全国自動ドア産業振興会		図 番

見込み(100 mm)

扉付(170 mm)







ドア芯 (65 mm)

ドア厚 (40 mm)

内観図

フロント材質：□SUS □ST ☒AL □W □その他()
 エンジン納まり：□内蔵 □直付
 起動センサ：外(無目) 内(無目) その他()
 補助センサ：外() 内() 対向・反射 (/) 光線
 特殊仕様(フラットレール、ヒータレール)

※JIS 安全距離() JIS 保護方策(要・不要)

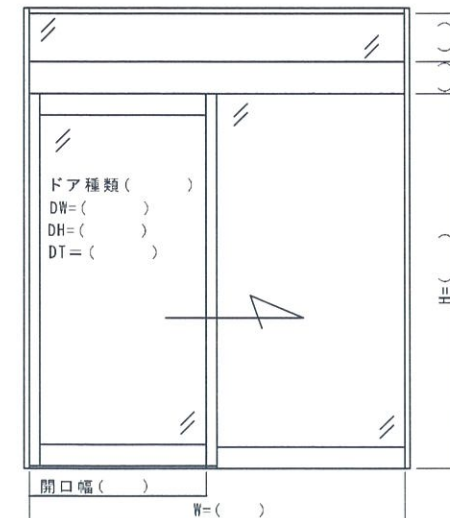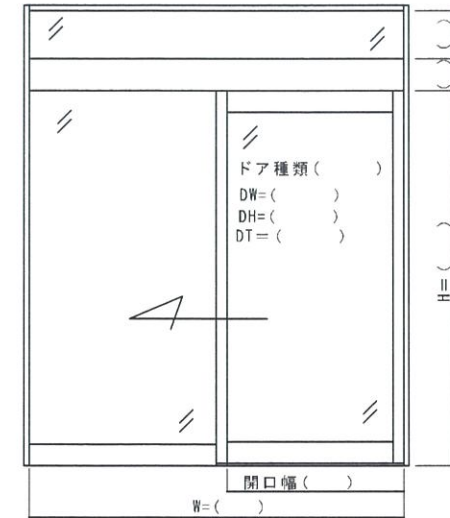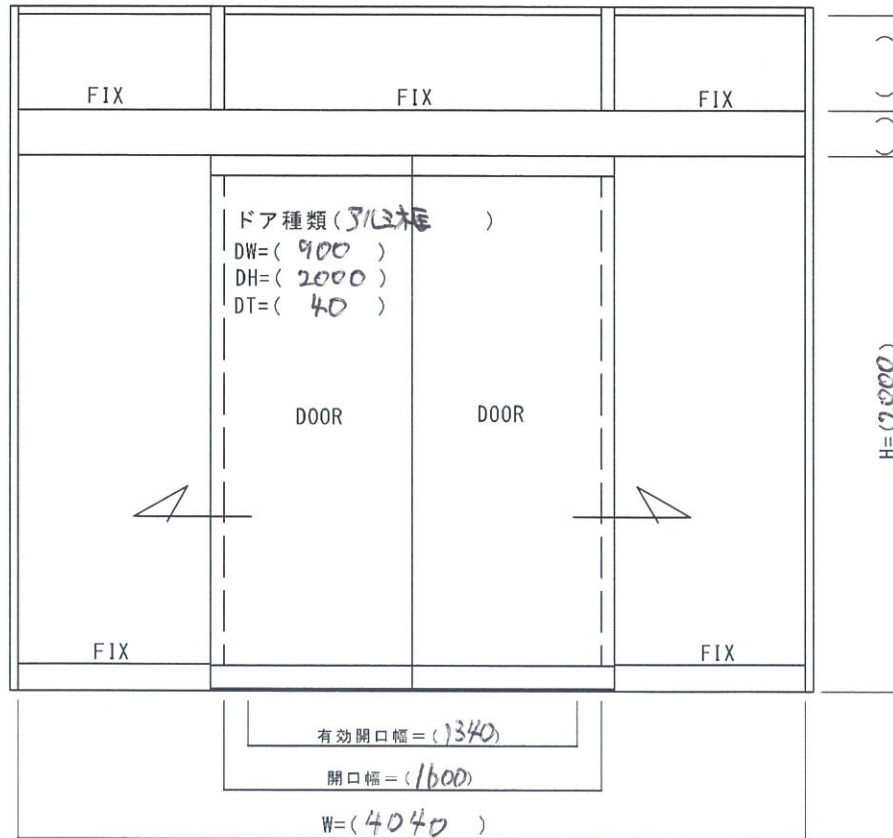

図面名称

現場調査表

No.	月日	訂正事項

JADSA

部長	課長	設計	製図	検査	縮尺
		野口			1/20
NP0法人全国自動ドア産業振興会					

設計監理

施工

工事名

設計番号

図番
1

件名：紫波斎苑かたくりの丘
建物外観



コメント

自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観



件名：紫波斎苑かたくりの丘

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



コメント

自動ドア開閉装置（装置取付状態）



外側起動センサ



件名：紫波斎苑かたくりの丘
内側起動センサ



	コメント
--	------

補助光線センサ



--	--

補助センサ/併用センサ

--	--

件名：紫波斎苑かたくりの丘

フロントの状態（正常な場合のみ省略可）

	コメント
--	------

ドアの状態(正常な場合のみ省略可)

--	--

ガイドレール/ドアガイドの状態(正常な場合のみ省略可)

	※フラットレール
---	----------

件名：紫波斎苑かたくりの丘
点検口

	コメント
--	------

附属機器

	ヒーターレール、ただしエンジン内部のブレーカー等は無し。
--	------------------------------

その他（予備）

--	--
