




アルミブロンズ100見込み自動ドアフロント納まり

- ※ 強化ガラスの戸先に欠けがあります。
- ※ 強化ガラスドア振れ止めの摺動音が大きくなっています。

郡山市高齢者文化休養センター 逢瀬荘 様
自動ドア装置交換工事

見積範囲

- ① 老朽化自動ドア装置撤去・処分費
- ② 新規両引自動ドア開閉装置
- ③ 内外無目付センサ、補助光線センサ
- ④ 戸当たり用スペーサー
- ⑤ 振れ止め音鳴り防止作業
- ⑥ 上記材料交換取付調整費

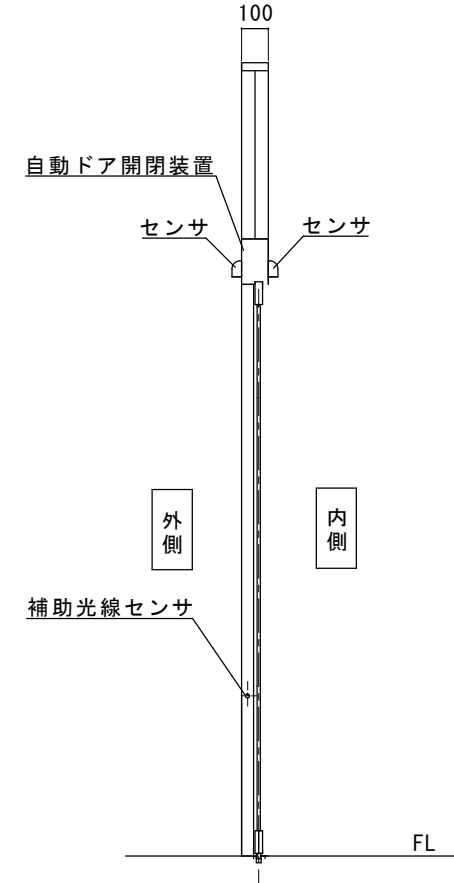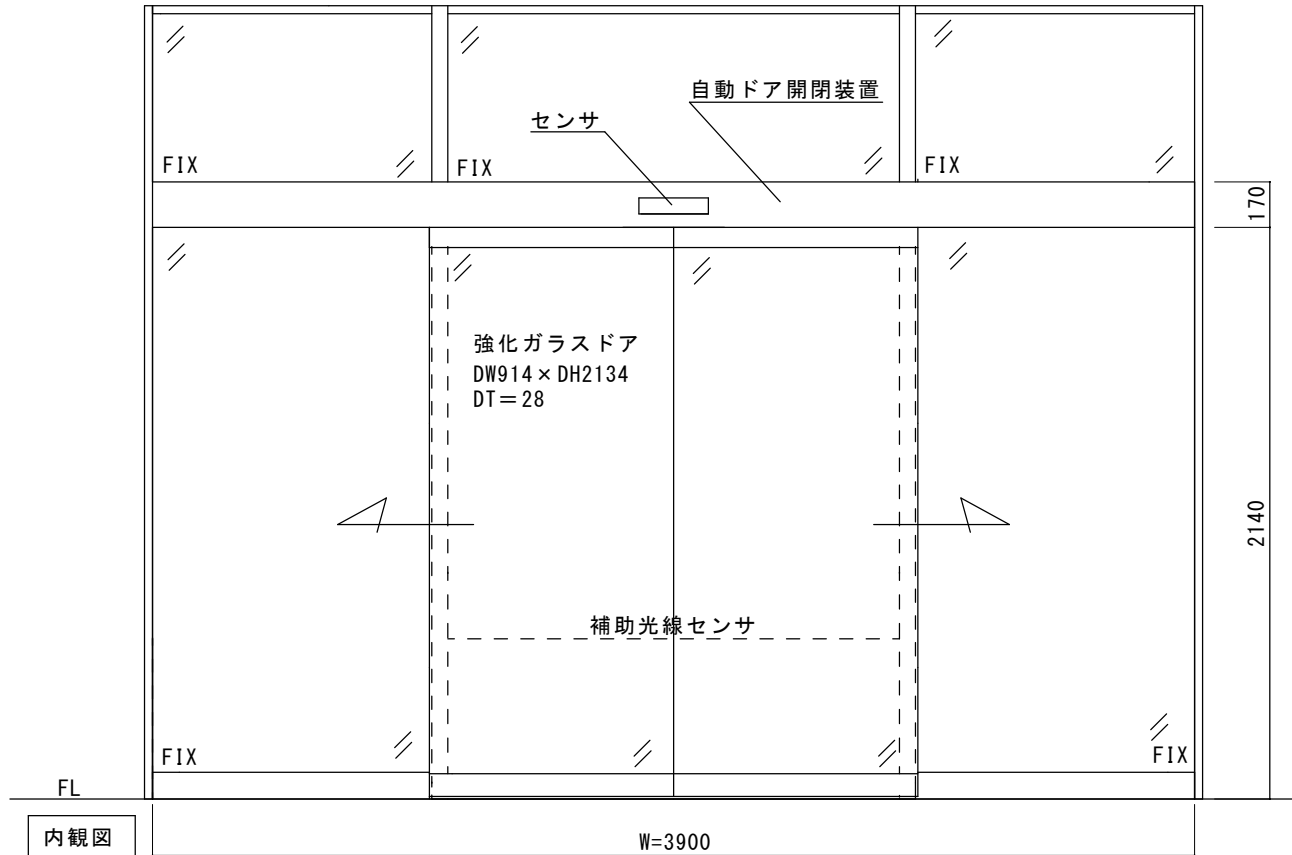


図面名称	▲					理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 郡山市高齢者文化休養センター 逢瀬荘 様 自動ドア装置交換工事
平面図・姿図・縦断面図	▲							野口	野口		1/20	施工	
No.	月日	訂正事項	JADSA			NPO法人全国自動ドア産業振興会							図番

郡山市高齢者文化休養センター逢瀬荘 様 自動ドア装置交換工事他
建物外観



作業箇所 外観

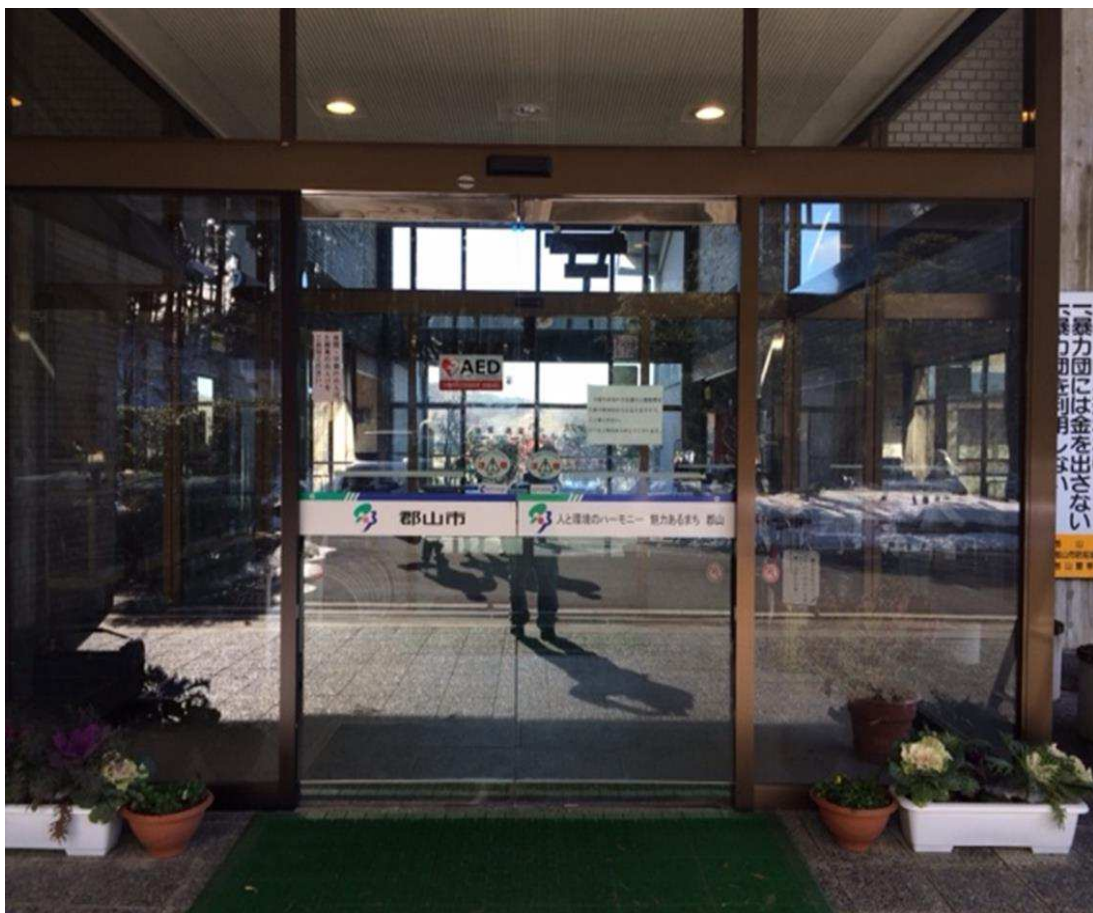



福島県郡山市逢瀬町河内字西午房沢11-2
郡山市高齢者文化休養センター逢瀬荘 様

昭和63年に設置された当該施設は、高齢者の文化の向上及び福祉の増進を図ることを目的とし、高齢者を中心に様々な方に利用されています。
自動ドア装置も20年経過しており、保守業者からは異音が発生しているという指摘を受けていました。
振興会は、通行者の安全と安心のために、自動ドア装置一式を寄付して、不安を解消しました。

平成30年10月9日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、バリアフリー化に寄与しました。

① 施工中



④ 新・旧 自動ドア開閉装置



⑤ 新・旧 センサ



② 施工中



⑥ 施工完了

自動ドア開閉装置と内外センサ、補助センサ(光電センサ)一式を交換しました。

③ 施工中

